

令和3年6月

平成30年7月豪雨災害関連 砂防事業 位置図

白浦・法花津地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長


(お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した白浦地区と法花津地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しております。昨年度は、国土調査修正や用地調査等を進め、一部の事業箇所では、工事に着手しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、依然としてコロナ禍が続いており、各分野で大きな影響が出ております。砂防事業においても、コロナ対応の影響等により、事業説明会等でお伝えした進捗に遅れが生じておりますが、早期完成に向けて誠意努めて参りますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

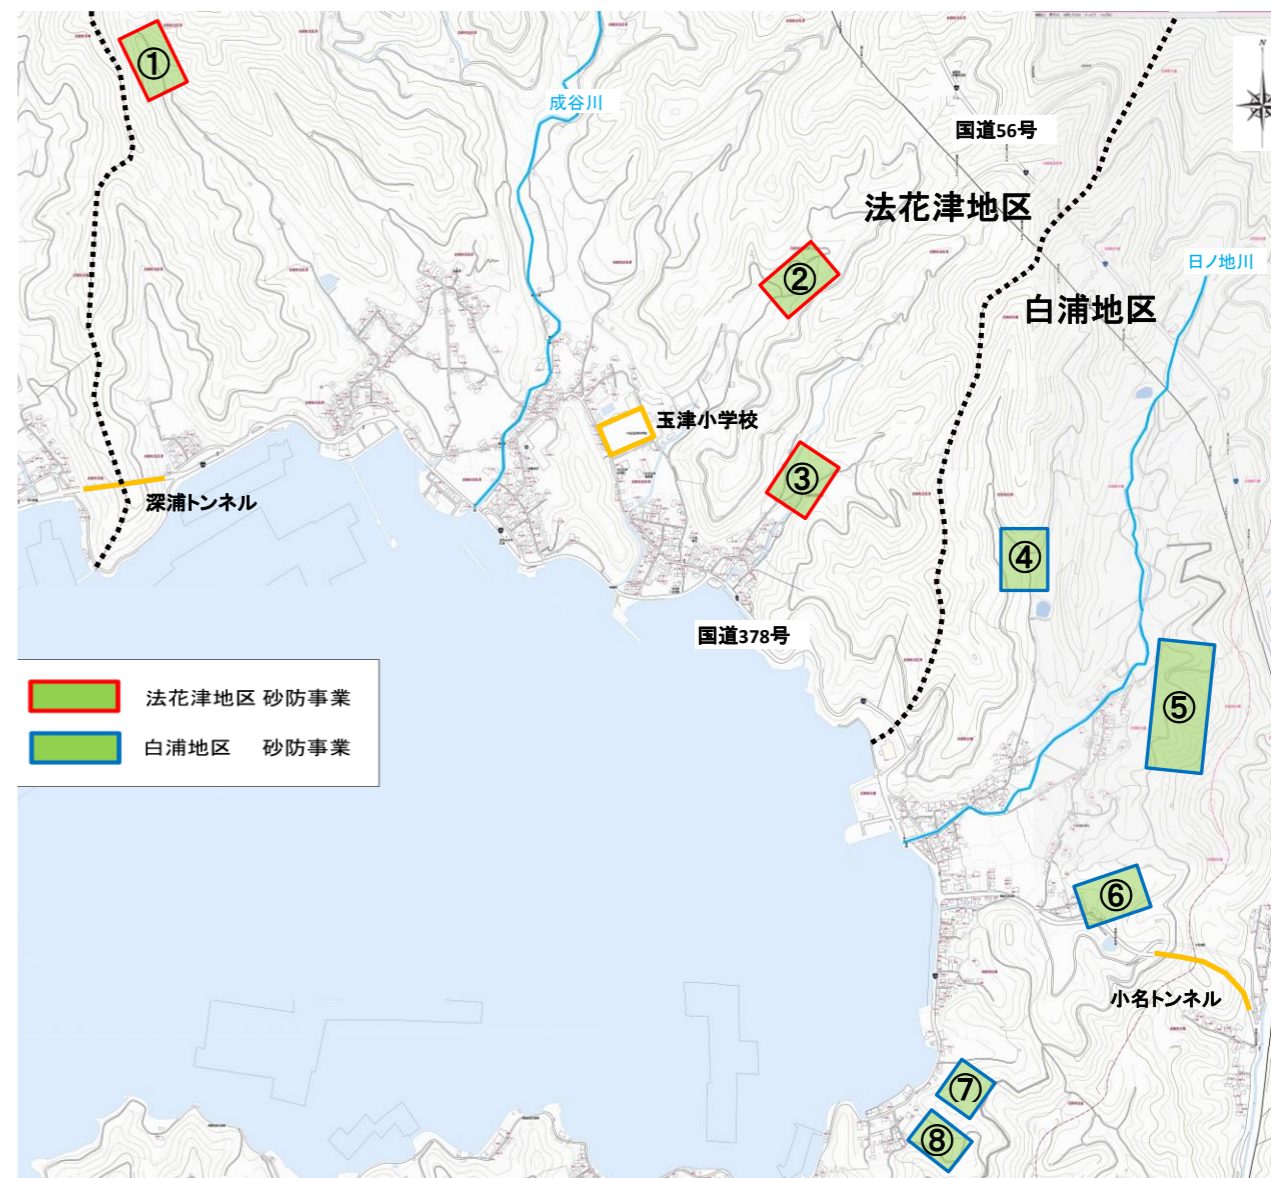

進捗表 (令和3年6月現在)

事業箇所	事業内容	事業進捗	令和3年度事業内容	担当係	内線番号
①小西川	砂防堰堤	用地調査中	用地調査、用地交渉	災害グループ	435
②今郷川	法枠	用地調査中および用地交渉を完了	用地交渉および工事着手	災害グループ	435
③大谷川	法枠	工事中	工事中	災害グループ	435
④西ガ谷川	法枠	工事中	工事中	災害グループ	435
⑤日ノ地川	砂防堰堤、法枠	用地調査を完了および工事中	用地交渉および工事中	災害グループ	435
⑥泉川	砂防堰堤、法枠	工事中	工事中	災害グループ	435
⑦先新浜川	砂防堰堤	工事中	工事中	河川港湾グループ	423
⑧畦屋東川	砂防堰堤	用地交渉中	用地交渉	河川港湾グループ	423

※白浦、法花津地区の事業の流れ
 測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒798-8511 宇和島市天神町7番1号

電話 0895-22-5211 (代表)

災害グループ (内線435)、河川港湾グループ (内線423)

※各事業箇所の担当グループについては「進捗表」に記載しております。

【玉津地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

法花津地区
 白浦地区

※令和3年6月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

