

## 平成30年7月豪雨関連 砂防事業 位置図

令和2年4月

白浦・法花津地区の皆様へ

愛媛県南予地方局  
河川港湾課長

### (お知らせ) 平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した白浦地区と法花津地区において、土砂災害対策としての砂防事業を実施しております。

事業内容については、これまでに開催した地元説明会での意見や農地復旧事業との調整結果等を集約し、国土交通省から技術的な指導を受け、計画してきたところです。

今回、地元の皆様と情報共有を図るため、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き事業へのご協力をお願い申し上げます。

本来であれば、別途説明会を開催してご説明すべきところですが、このたびの新型コロナウイルス感染症対策のため、集会等の自粛が要請されていることから、このような紙面での報告となりましたことをご理解願います。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先


愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒798-8511 宇和島市天神町7番1号

電話 0895-22-5211 (代表)

災害グループ(内線435)、河川港湾グループ(内線423)

※各事業箇所の担当グループについては「進捗表」に記載しております。

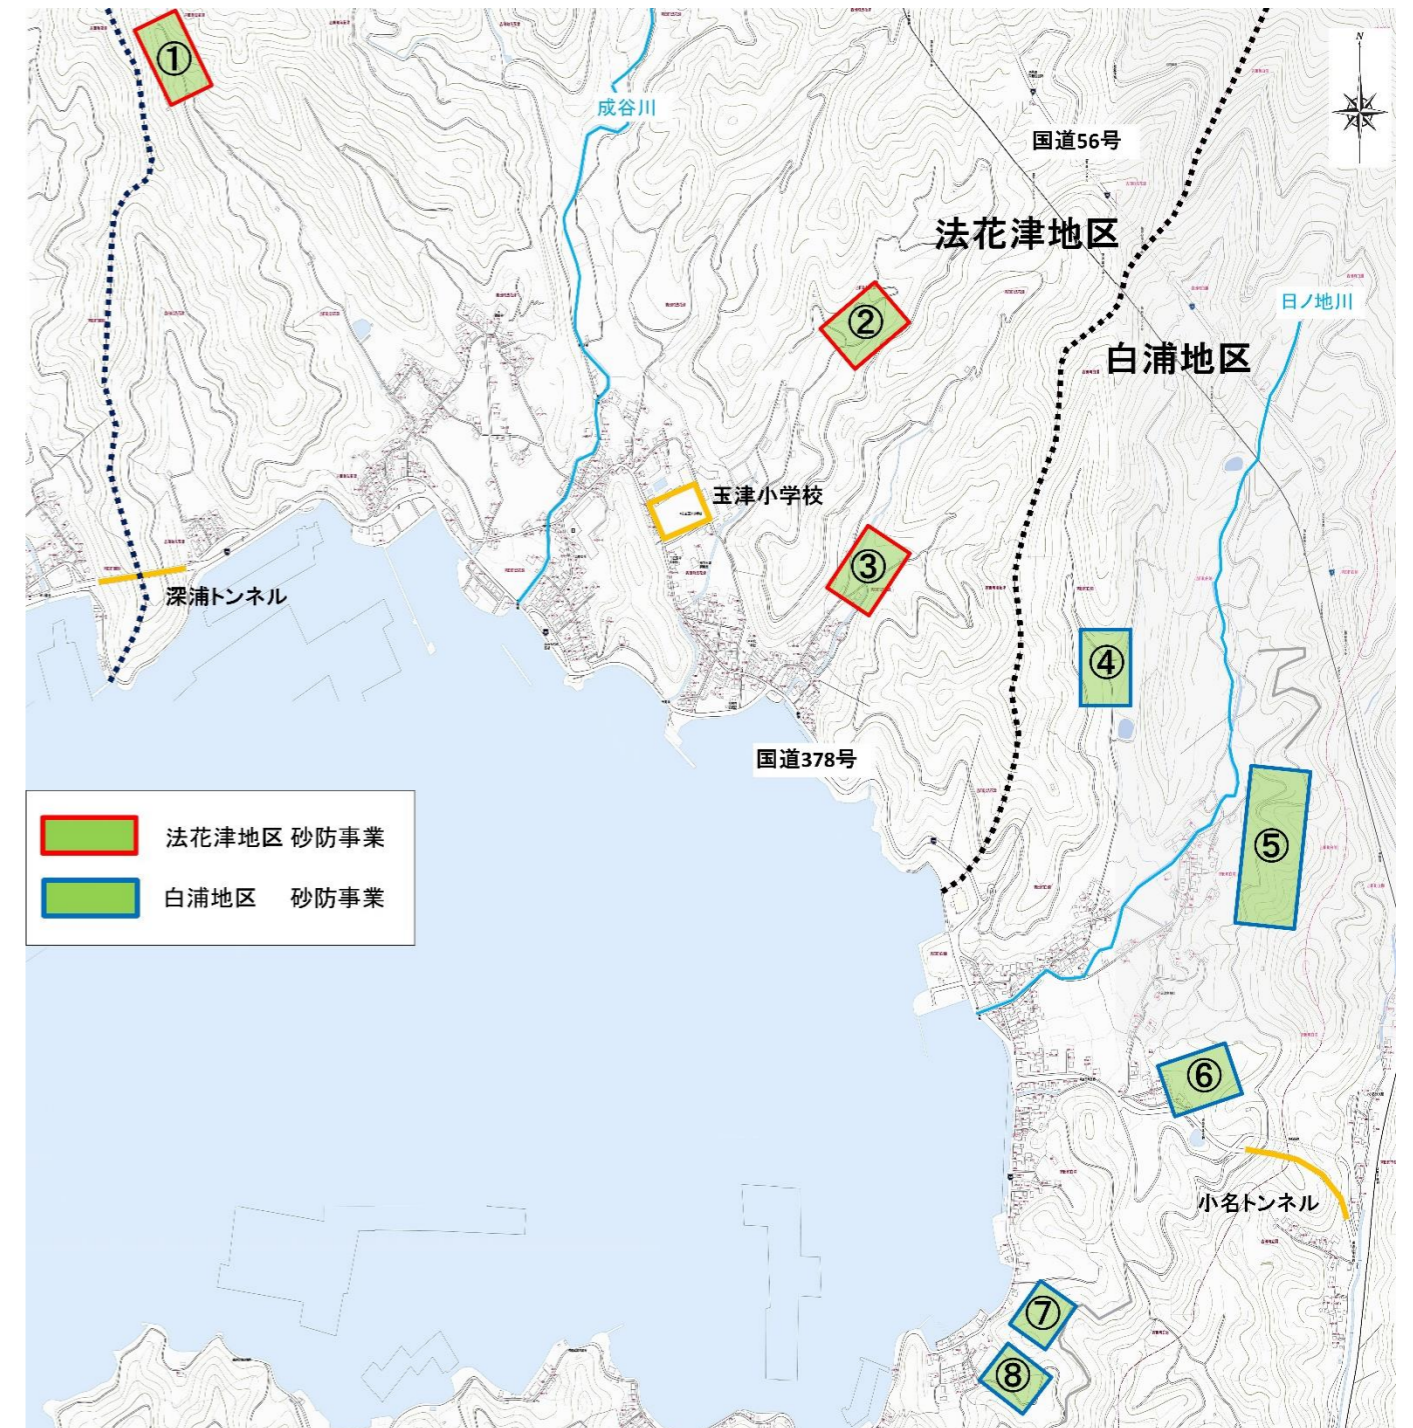

### 進捗表 (令和2年4月現在)

事業箇所	事業内容	事業進捗	令和2年度事業内容	担当係	内線番号
①小西川	砂防堰堤	国土交通省の設計確認を完了	国土調査修正、用地調査	災害グループ	435
②今郷川	法枠	用地調査中	用地交渉、工事着手	災害グループ	435
③大谷川	法枠	用地調査中	用地交渉、工事着手	災害グループ	435
④西ガ谷川	法枠	用地調査中	用地交渉、工事着手	災害グループ	435
⑤日ノ地川	砂防堰堤、法枠	用地調査中	用地交渉、工事着手	災害グループ	435
⑥泉川	砂防堰堤、法枠	用地交渉中、工事を発注	用地交渉、工事着手	災害グループ	435
⑦先新浜川	砂防堰堤	工事中	工事中	河川港湾グループ	423
⑧畦屋東川	砂防堰堤	用地交渉中	用地交渉、工事着手	河川港湾グループ	423

※白浦、法花津地区の事業の流れ

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手

# 【玉津地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

法花津地区
  白浦地区

※令和2年4月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります。

