


宇和島市吉田町 スプリンクラー自動化施設稼働状況

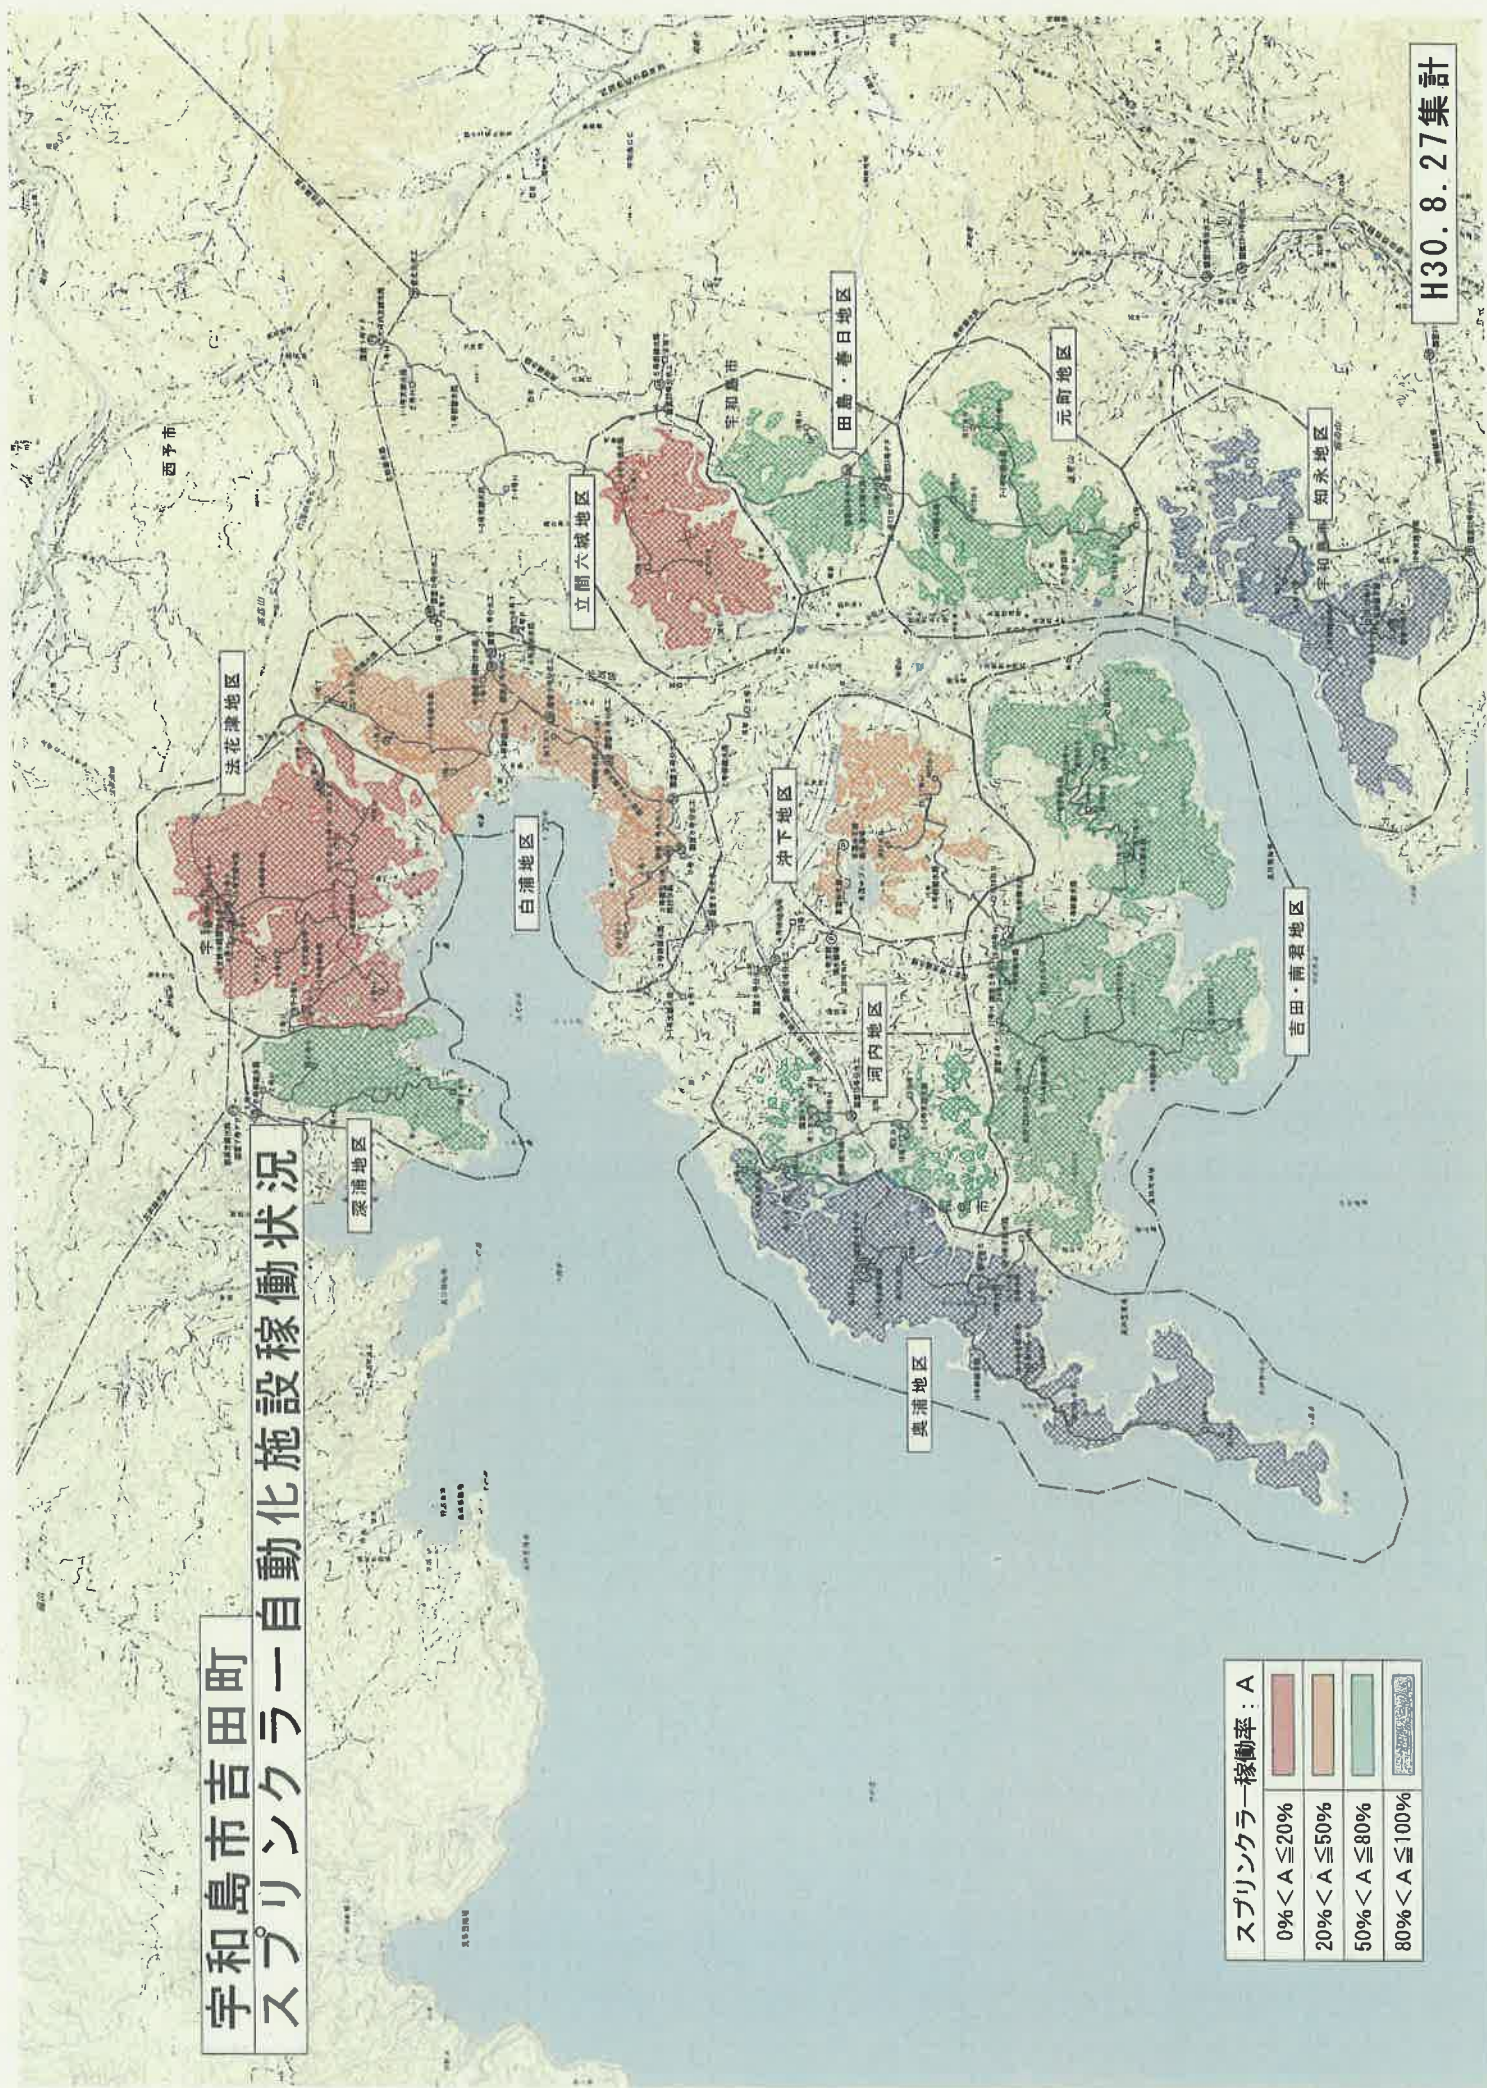

スプリンクラー稼働率：A

0% < A ≤ 20%	(Red)
20% < A ≤ 50%	(Orange)
50% < A ≤ 80%	(Green)
80% < A ≤ 100%	(Blue)

吉田町畑かん施設の復旧



散水線(スプリンクラー)の復旧



園内支線水路の復旧



道路の土砂撤去



園内支線水路の復旧



制御室 既存取水スタンド



スプリンクラー試験散水

県営1号幹線水路（白浦2ブロック） 仮復旧配管状況写真



8月11日 仮配管完了
8月21日 通水試験
※制御室スタンドより
取水可能





接続部布設状況

南予用水農業水利事業 附帯営事業位置図

【畑かん自動化施設稼働状況】(八幡浜支局管内)

旧市町名	ブロック数	自動施設		未稼働ブロック数
		稼働ブロック数	前回からの稼働ブロック数	
旧八幡浜市	52	51	1	1
旧保内町	27	27	0	0
旧伊方町	28	28	0	0
旧瀬戸町	6	6	0	0
旧三崎町	7	7	0	0
旧三瓶町	9	9	0	0
旧明浜町	15	13	0	2
計	144	141	1	3

(平成30年8月30日時点)

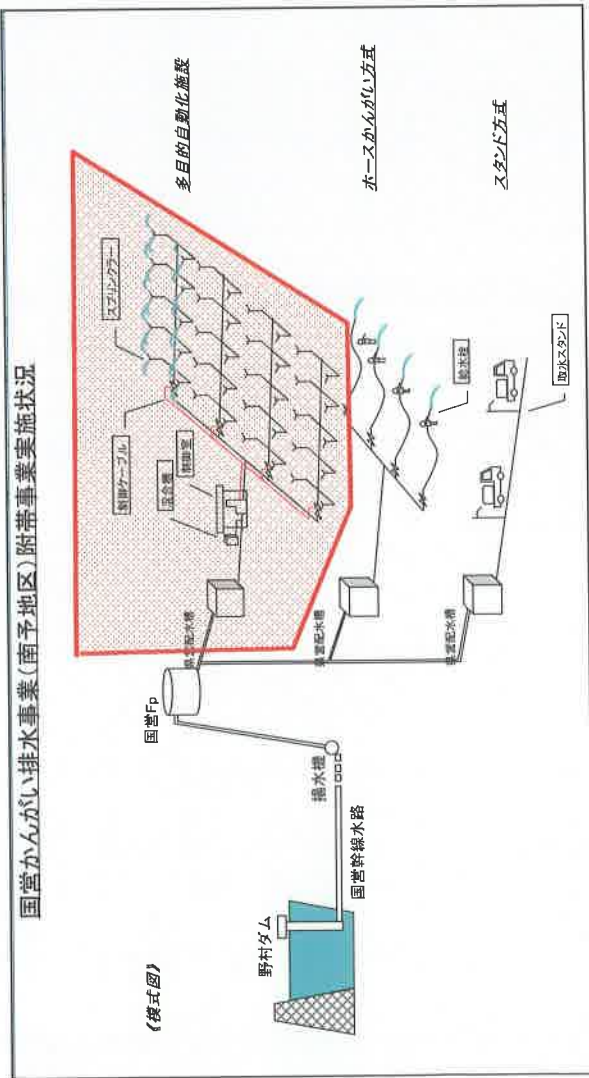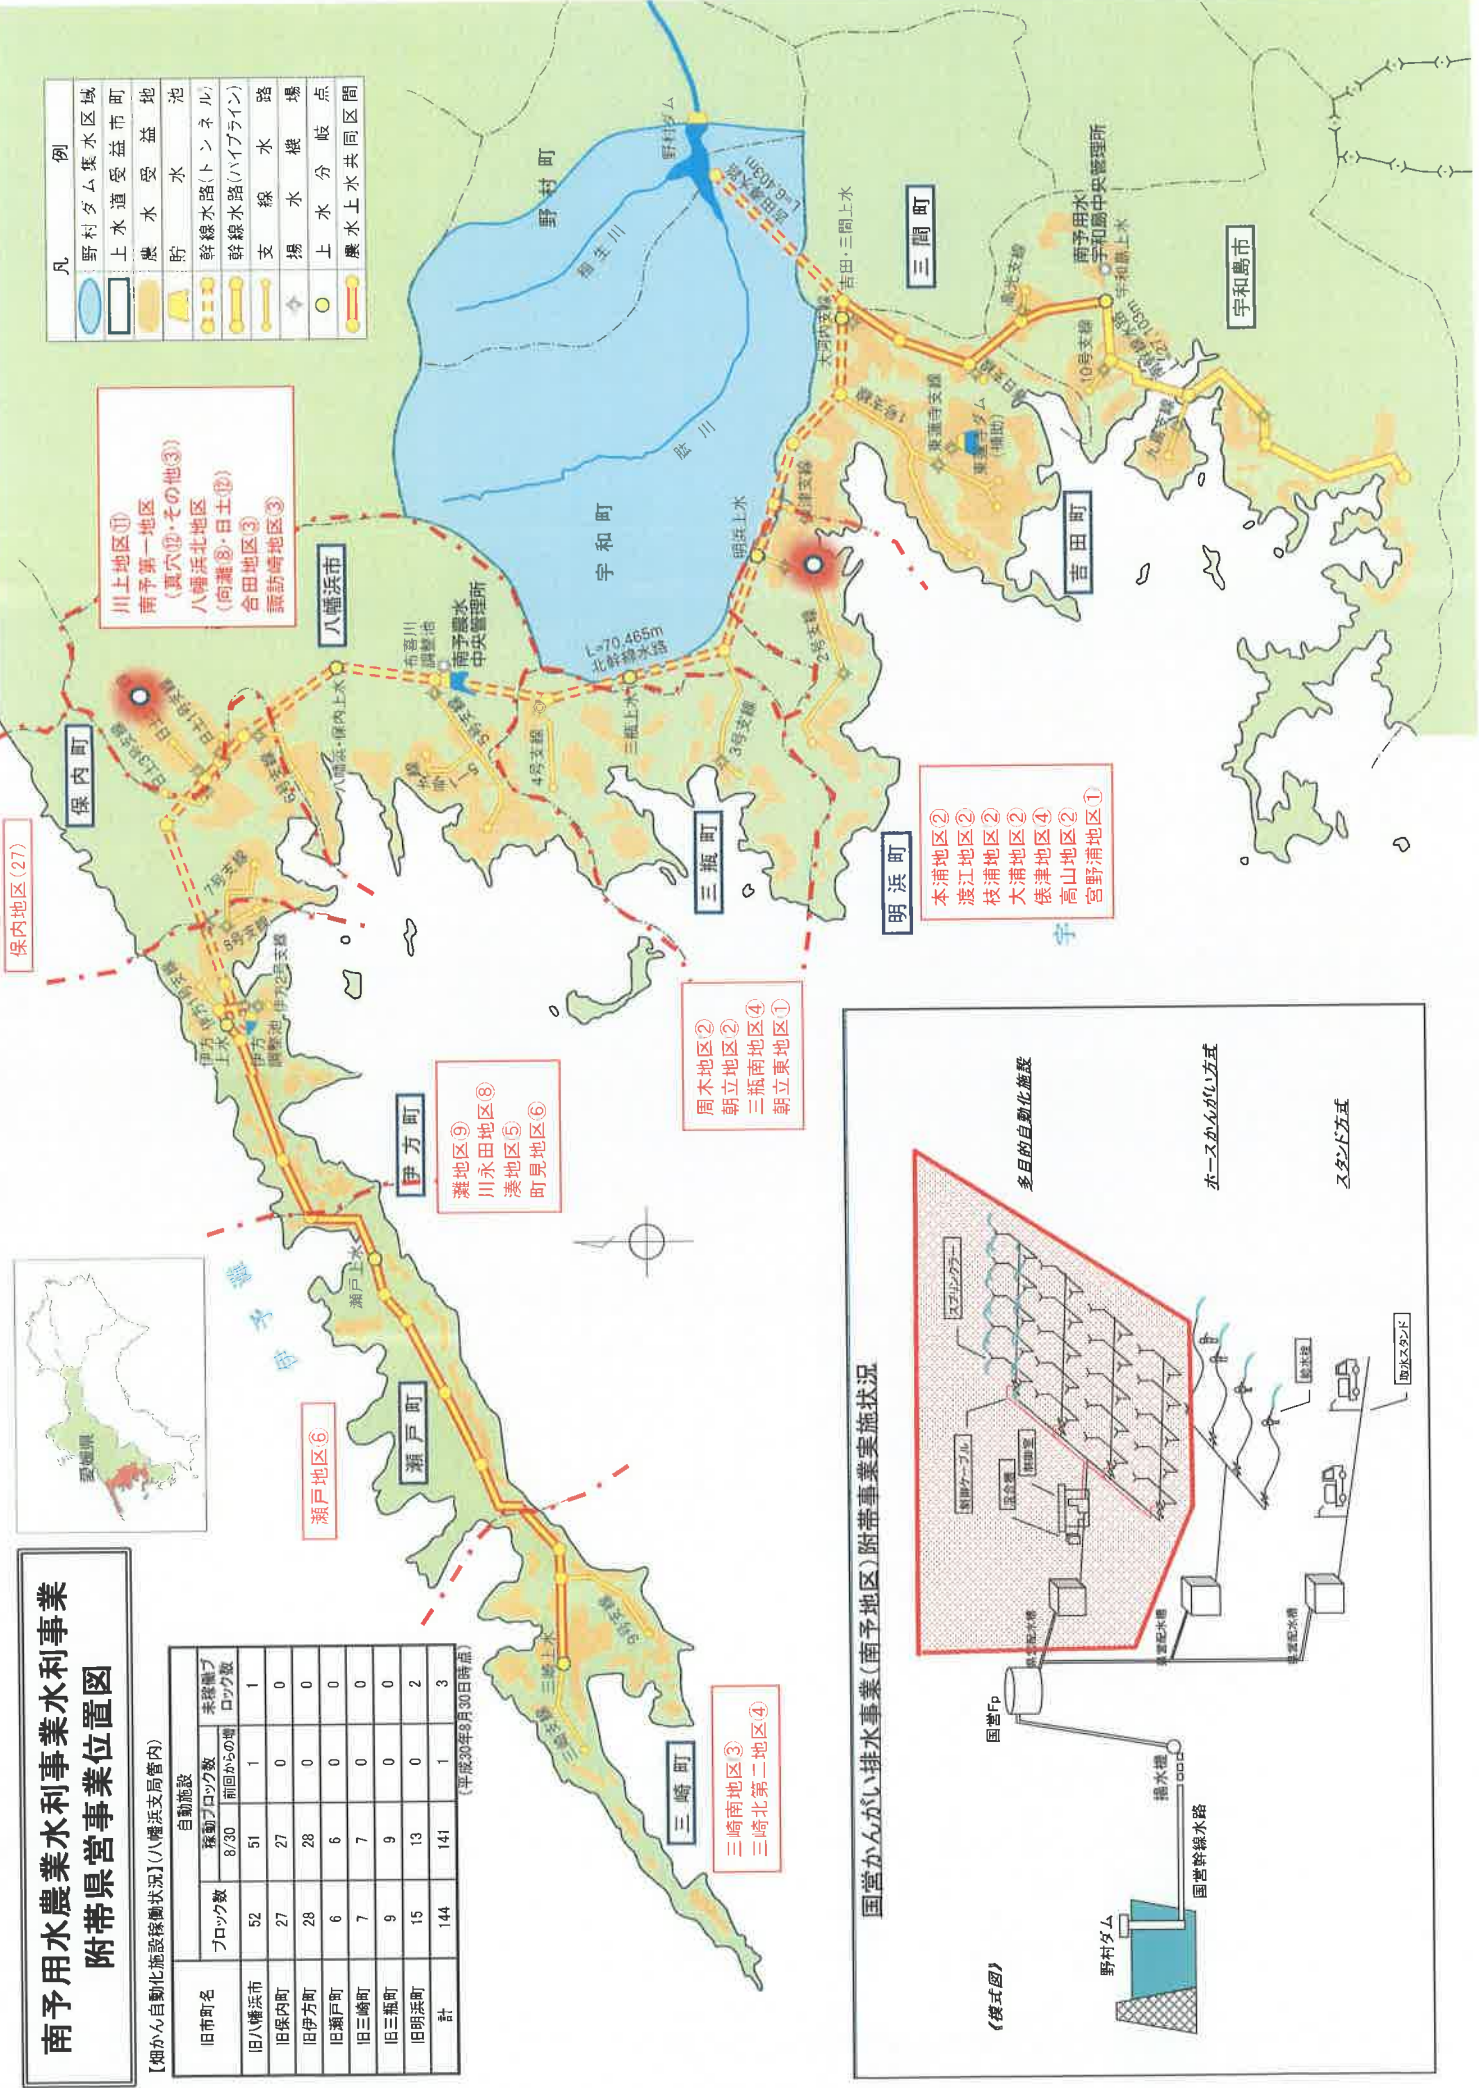

畑かん施設 応急仮復旧状況写真
(西予市明浜町)

園内支線水路及び散水線仮配



減圧弁工仮復旧



園内支線水路仮配管

吉田地区応急仮復旧進捗状況(8/24時点)

工種	地区	路線名・河川名	着手日	復旧内容	進捗状況	完成予定
道路	玉津	ウラノク線	7/28	土砂撤去、排水路復旧		完了
		ヤツオモテムカイ線	7/28	土砂撤去		完了
		山崎成谷線	7/28	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
		影平西ヶ谷線	8/16	土砂撤去、大型土嚢設置	20%	8/31
		ヲモ田入道ヶ谷線	8/8	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
		三ツ尾奥南線	7/28	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
		郷田中線	8/3	大型土嚢設置		完了
		大谷線	8/3	大型土嚢設置		完了
		鍋倉線	8/16	大型土嚢、覆工板設置	40%	8/31
		川久保西ヶ谷線	7/28	大型土嚢設置(当初完了、継続中)	70%	8/31
		三ツ尾越センバ線	8/16	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
		今郷大谷西付支線	8/17	土砂撤去、大型土嚢設置	10%	8/31
		今郷谷線	8/21	土砂撤去、大型土嚢設置	0%	8/31
		立間	法華津峠線	7/31	土砂撤去	
	右キビユウ線		8/17	土砂撤去	80%	8/31
	トノ畑線		7/17	土砂撤去、大型土嚢設置	90%	8/31
	高城集会所前線		7/17	土砂撤去、大型土嚢設置	90%	8/31
	鳥ヶ藪齒長線		7/12	土砂撤去、大型土嚢設置	80%	8/31
	中ノ谷線		7/31	土砂撤去		完了
	大平線		8/3	土砂撤去		完了
	トビノコ線		8/3	土砂撤去		完了
	下ツガノクチ線		8/8	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
	谷ノ内線		8/13	土砂撤去	20%	8/31
	喜佐方	鶴間谷線	7/28	土砂撤去		完了
		京田センバ谷線	7/28	土砂撤去	50%	8/31
		京田ハバキダ線	7/28	土砂撤去		完了
		検校谷桃ノ木原線	7/28	土砂撤去、大型土嚢設置	60%	8/31
		桃ノ木原京光線	7/28	土砂撤去、大型土嚢設置	60%	8/31
		牛ノ神高畑線	7/28	土砂撤去		完了
		高畑線	7/28	土砂撤去		完了
		東蓮寺ダム線	7/28	土砂撤去		完了
		鬼王ムラサキ線	7/28	土砂撤去		完了
		川平奥線	7/28	土砂撤去		完了
		川平四ツ辻線	8/16	土砂撤去	60%	8/31
		樋口線	8/21	土砂撤去、大型土嚢設置	10%	8/31
		吉田大木谷線	8/21	土砂撤去、大型土嚢設置	50%	8/31
		中屋敷面田線	8/21	土砂撤去	0%	8/31
		木ノ下池ノ谷線	8/20	土砂撤去	30%	8/31
	奥南	長惣貝フ口線	7/30	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
		牛川石原砂線	7/28	舗装版亀裂復旧		完了
		浅川神ノ奥線	7/27	土砂撤去		完了
	吉田	掛引線	8/17	土砂撤去、大型土嚢設置		完了
河川	立間	柏木溪流	7/24	浚渫、大型土嚢設置	80%	8/31
		中ノ谷川	8/27	浚渫	0%	9/30
	吉田	大工町川	7/20	浚渫		完了
		南谷川	7/20	浚渫		完了
		寺川	8/3	浚渫		完了
		タカソリ線・鶴間川支流	8/16	浚渫	10%	8/31
		重浦川	8/17	浚渫		完了
		浅川地区溪流	8/18	浚渫	70%	8/31
		鶴間食品横溪流	8/24	浚渫	0%	8/31

Press Release



平成30年8月29日
(公財) えひめ農林漁業振興機構
農政課農地・担い手対策室

地域被災農業者支援隊の設置について

7月豪雨災害により被災を受けた農業者へ現地で寄り添い農業経営の再開に向けた個別訪問相談を行う地域被災農業者支援隊を8月31日にえひめ農業経営サポートセンター〔(公財) えひめ農林漁業振興機構〕に設置し、9月から被災を受けた各地域において支援活動を開始することとしましたので、お知らせします。

なお、支援隊員を対象とした第1回目の被災農業者支援隊打合せ会を8月31日(金)13時からJA愛媛7階シルバーホールにて開催します。

地域被災農業者支援隊の概要

- 地域農業に精通したJA、市町、県のOB等を中心に選定。
- 県の地域営農再建支援相談窓口からの要請や自らの支援活動を通じ、担当地域のJA及び市町と連携し、被災農業者への個別訪問相談活動を行う。

1 担当地域及び人数

JAえひめ南	宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町	3名
JAひがしうわ	西予市	1名
JAにしうわ	八幡浜市、伊方町	1名
JA愛媛たいき	大洲市、内子町	2名
JA松山市・えひめ中央	松山市	1名
JAおちいまばり	今治市、上島町	3名
計		11名

2 活動内容

- (1) 戸別訪問の実施、意向把握
- (2) 各分野の農業経営の専門家(税務、生産技術等)との連携
- (3) 中長期的な経営計画等の策定支援


3 被災農業者支援隊打合せ会(第1回)の開催

- 日時 8月31日(金)13時00分～
- 場所 JA愛媛7階シルバーホール
- 内容 業務の進め方、国・県の災害復旧対策等

【問合せ】

農地・担い手対策室 農地活用係 担当者 池内真悟(内線4036)

被災農業者経営再開訪問相談事業の概要

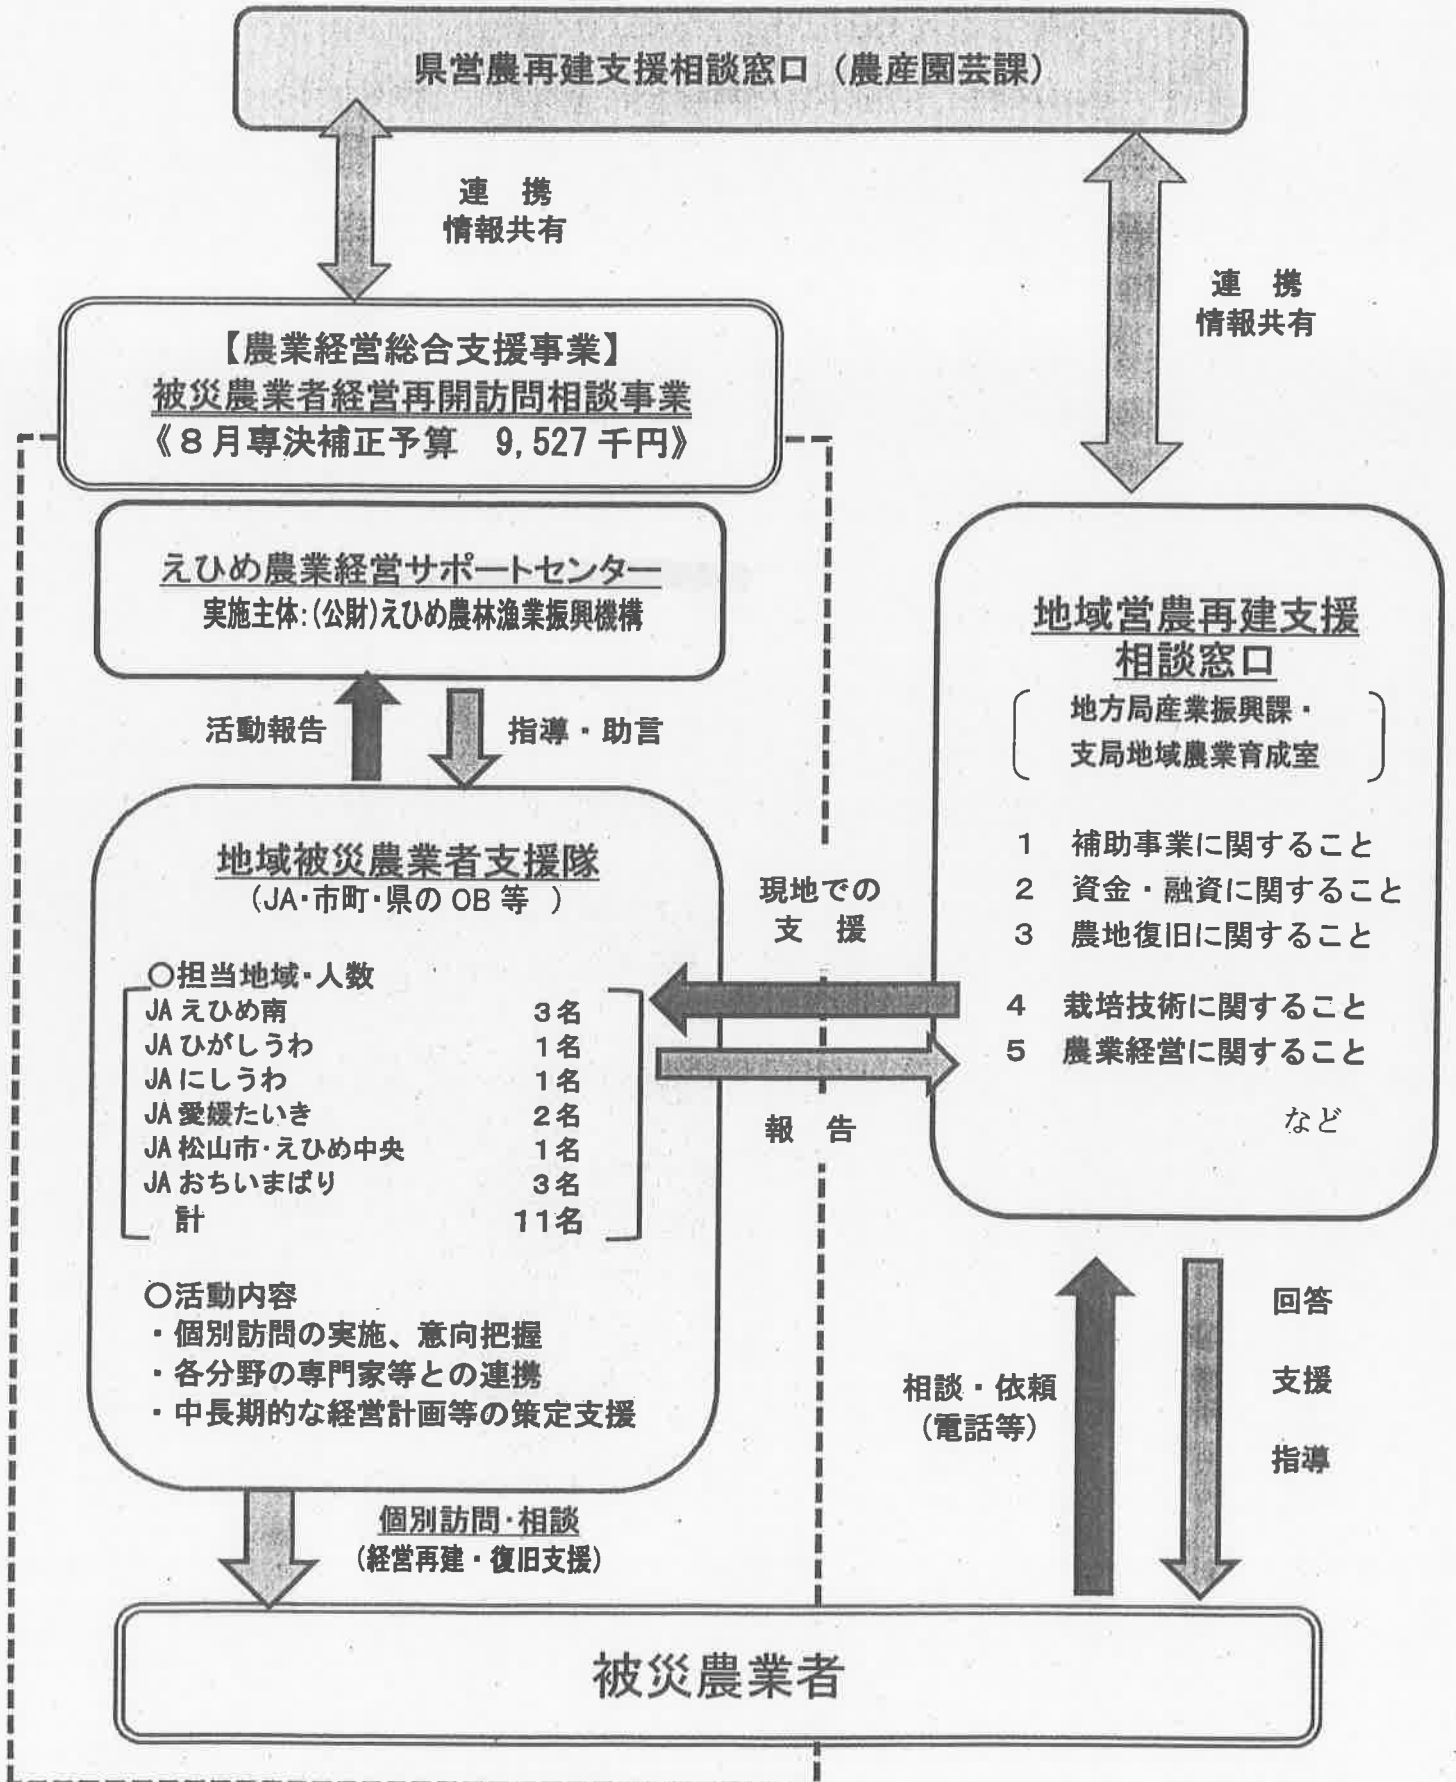

愛媛みかん発祥の地 吉田町 みかんボランティア急募!

平成30年7月豪雨は、全国有数のみかんの産地である愛媛県・吉田町においては、土砂災害による農道やモノレールの寸断、灌水施設であるスプリンクラーの損傷など、2,000か所以上で傷跡を残しました。



このような中、みかん農家は、住宅や園地の復旧作業に追われ、みかん園の十分な管理ができておらず、このままでは、産地の維持が脅かされることとなります。このため、8月中旬から「みかんボランティア」を募集し、多くの方々に摘果作業や園地の復旧などをしていただいているところですが、まだまだ復旧には程遠い現状が続いています。このため下記のとおり「みかんボランティア」を募集します。皆さんのお力をお貸しください。

実施者

JAグループ愛媛大雨被害対策本部

実施日及び申込締切り

実施日	申込締切り
9月1日(土)、9月2日(日)	8月27日(月)
9月8日(土)、9月9日(日)	9月3日(月)
9月15日(土)、9月16日(日)	9月10日(月)
9月22日(土)、9月23日(日)	9月17日(月)

作業内容及び作業時間

みかん園地での作業 約4時間

作業場所

宇和島市吉田町内の柑橘園場

集合時間・集合場所

6:15 バス乗車希望者:愛媛県庁議会前

7:30 自家用車利用者:JA えひめ南 味楽共選場(宇和島市吉田町立間 2-2266)

参加費

無料(ただし、昼食代、飲料等は自己負担)

募集定員

目標:70名/日 ※日程等調整させていただく場合がございます。

申込方法

下記QRコードから申し込んでください。

<https://goo.gl/forms/aGnrUyp6YnL5P3Ky1>



問合せ先

JA えひめ南立間中央支所 (0895-52-2939)

JA 愛媛中央会 JA 支援部 (089-948-5662)

愛媛県農地・担い手対策室 (089-912-2553)
