●高架区間（竹原南工区）の工事概要

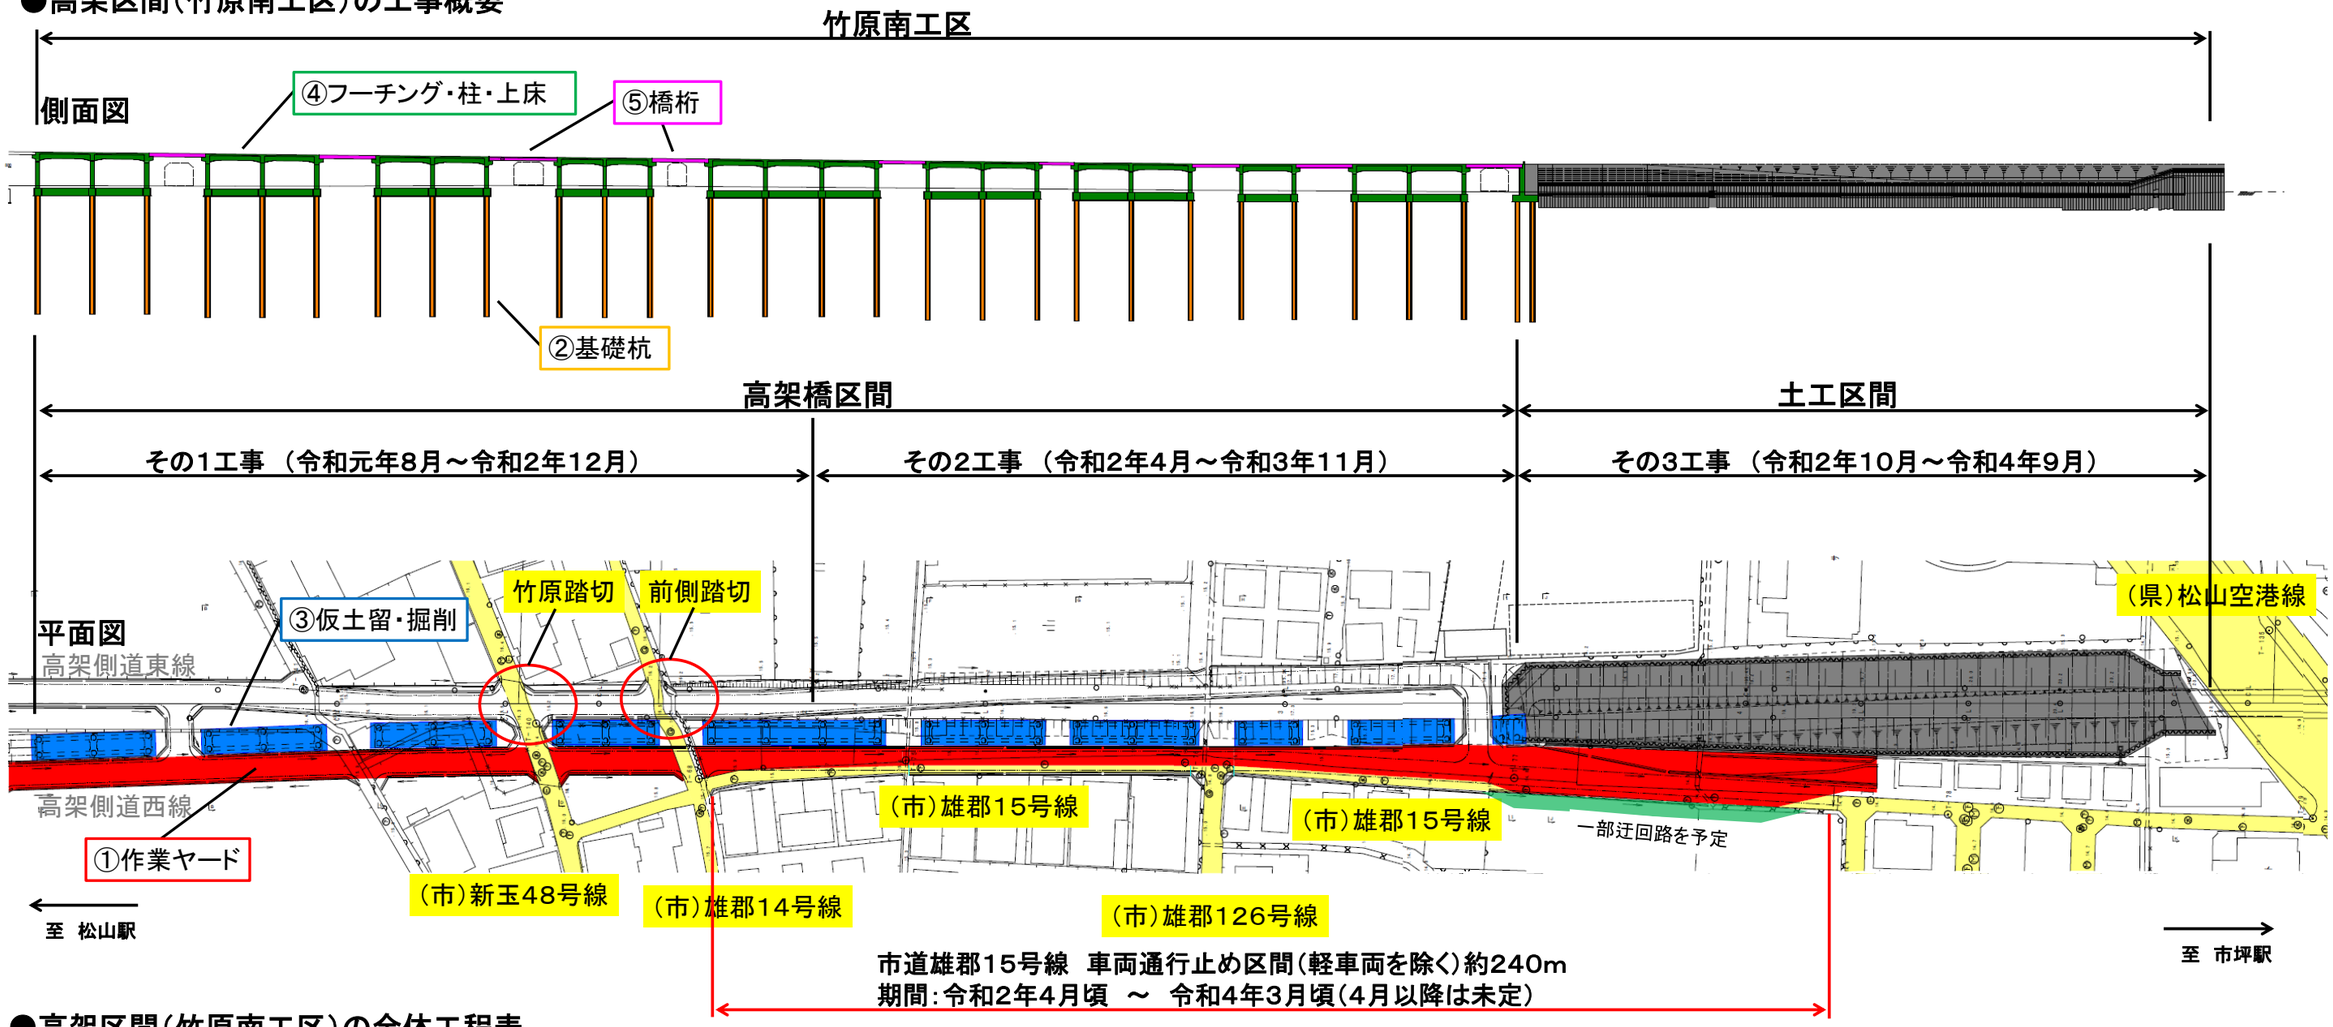

●高架区間（竹原南工区）の全体工程表

工事名		工事箇所	主な工事内容
その1 その2	①	高架橋工事（作業ヤード）	・防護設備の設置（万能塀・線路防護網等） ・工事用道路の整備（砕石敷均し） ・既設構造物の取壊し（圧砕機等による取壊し）
	②	高架橋工事（杭基礎）	・基礎杭の構築（掘削、鉄筋、コンクリート打設等） ・発生土の運搬
	③	高架橋工事（仮土留・掘削）	・仮土留の施工（鋼矢板の圧入、基礎掘削） ・発生土の運搬
	④	高架橋工事（高架橋・架道橋）	・フーチングの施工（鉄筋、コンクリート打設等） ・仮設足場の設置 ・柱、上床、高欄の構築（鉄筋、コンクリート打設等）
	⑤	高架橋工事（高架橋桁関係）	・橋桁の搬入（トレーラーによる搬入） ・橋桁の架設（大型クレーンによる架設）
その3	⑥	土工部工事（液状化対策・補強盛土）	・液状化対策の施工（鋼矢板の圧入、タイブル設置等） ・補強盛土の施工 ・防音壁の設置

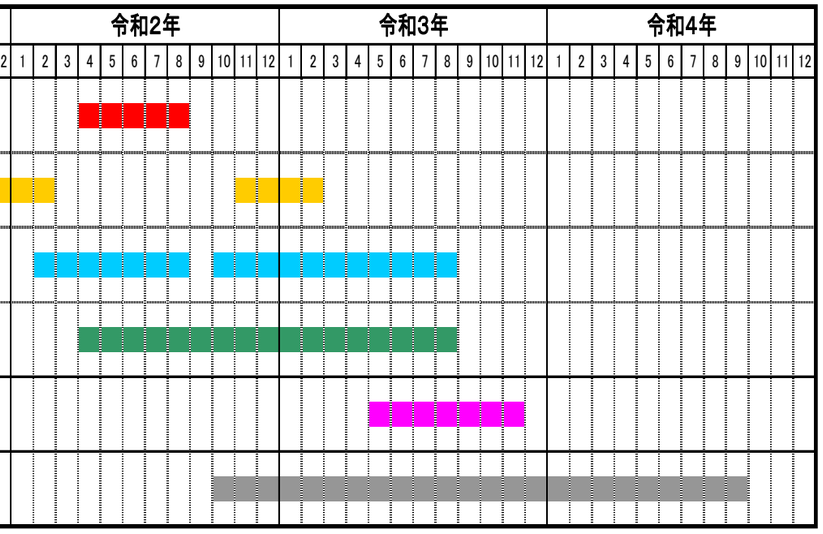

※上記高架橋工事の後、電気・軌道工事を令和6年10月頃まで予定しています。
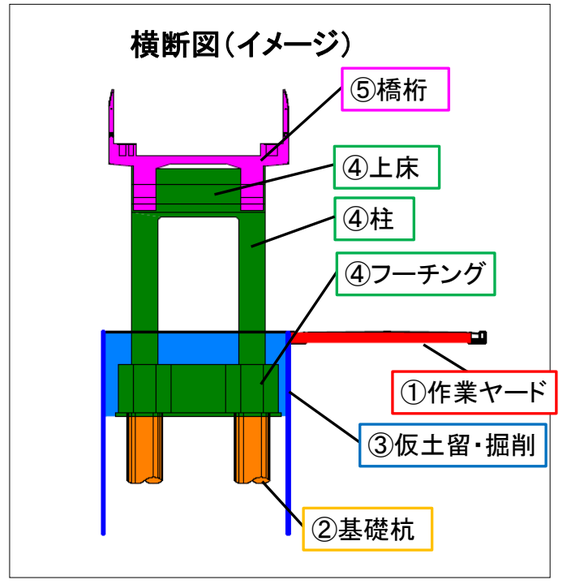
横断図（イメージ）
